



VIA MAGNA GRAECIA N.341 - 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

**PERSANO BARACCAMENTO LOTTO FUNZIONALE  
PROGETTO GENERALE**

CUP: B29J20002390001

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELABORATO  
N. 08-001**

**CRONOPROGRAMMA**

**Responsabile Unico del Procedimento**

geom. Antonio Del Prete

**I Progettisti Area Tecnica del Consorzio**

ing. Guido Contini

geom. Pietro Mancino

DATA SETTEMBRE 2024

COD. ID. 1015


REV.

NOTE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: Persano Baraccamento lotto funzionale

importo lavori	€	1 559 398,41	
produzione ottimale mensile in	€	129 949,87	
coefficiente per classe climatica	favorevole	>>>	1,21
tempo contrattuale in mesi	n	12	mesi
tempo contrattuale in giorni		365	giorni
tempo di avvio cantiere		1	mesi
tempo di collaudo		6	mesi

mese		Produttività mensile (%)	Produzione mensile (€)	Avanzamento (€)
1	Mesi	0,20	€ 25 989,97	€ 25 989,97
2	Mesi	0,70	€ 90 964,91	€ 116 954,88
3	Mesi	0,90	€ 116 954,88	€ 233 909,76
4	Mesi	1,00	€ 129 949,87	€ 363 859,63
5	Mesi	1,00	€ 129 949,87	€ 493 809,50
6	Mesi	1,00	€ 129 949,87	€ 623 759,36
7	Mesi	1,25	€ 162 437,33	€ 786 196,70
8	Mesi	1,25	€ 162 437,33	€ 948 634,03
9	Mesi	1,25	€ 162 437,33	€ 1 111 071,37
10	Mesi	1,25	€ 162 437,33	€ 1 273 508,70
11	Mesi	1,20	€ 155 939,84	€ 1 429 448,54
12	Mesi	1,00	€ 129 949,87	€ 1 559 398,41
13	Mesi		collaudo	
14	Mesi		collaudo	
15	Mesi		collaudo	
16	Mesi		collaudo	
17	Mesi		collaudo	
18	Mesi		collaudo	

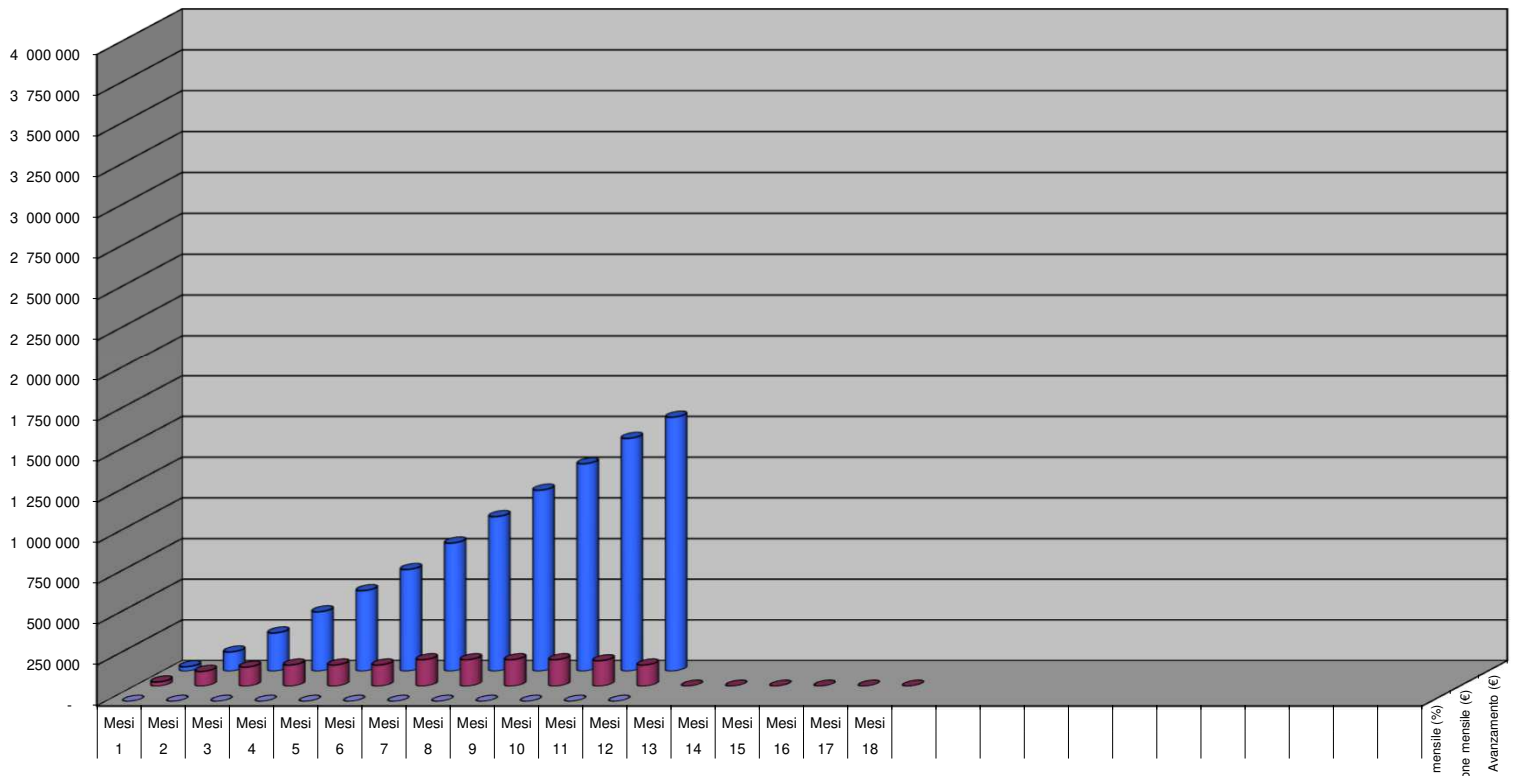

- Produttività mensile (%)
- Produzione mensile (€)
- Avanzamento (€)

***“Persano Baraccamento lotto funzionale”***

CRONOPROGRAMMA														
LAVORAZIONI		Inizio L.	DURATA DEI LAVORI											
Fasi	Descrizione		MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12
A) FASE DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE														
1	Attività preliminari per cantierizzazione, rilievi, picchettamento, organizzazione mezzi e personale, richiesta forniture, ricerca di ordigni bellici, ecc....		x	x	x	x	x	x	x					
B) CONDOTTA PRINCIPALE														
2	Posa Condotta in acciaio				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Realizzazione Pozzetti d sfiato, scarico, blocchi di ancoraggio						x	x	x	x	x	x	x	x
4	Attraversamento stradali e corsi d'acqua								x	x	x	x	x	x
5	Realizzazione piazzola di consegna ai reparti ed opera varie								x	x	x	x	x	x
C) REPARTO 26 AS														
6	Posa condotta secondaria e realizzazione pozzetti e organi di manovra									x	x	x	x	x
7	Attraversamenti stradali, corsi d'acqua, pezzi speciali ed organi di manovra										x	x	x	x
D) IMPIANTI TECNOLOGICI														
8	Impianto protezione catodica												x	x
9	Impianto telecontrollo/telelettura													
E) FASE DI SMOBILIZZO DEL CANTIERE														
10	Opere di finitura (sbaraccamento, pulizia area cantiere, ripristino dei luoghi)													
DURATA TOTALE DEI LAVORI: 365 (Trecento sessantacinque) giorni														
